Руководитель муниципального проекта Любименко Светлана Евгеньевна 01.12.2020 (подпись, дата)	ОДОБРЕН Муниципальным проектным офисом (протокол от "01" 12 2020 г. N 3)
	СОГЛАСОВАН Куратор муниципального проекта Голосов Василий Васильевич 01.12.2020 (подпись, дата)

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"Капитальный ремонт электроснабжения кинотеатра «Космос» Котовского муниципального района"
Общий статус реализации – закрытие

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
отсутствие отклонений	*отсутствие отклонений*	*отсутствие отклонений*	*отсутствие отклонений*	*отсутствие отклонений*

1. Ключевые риски


N п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствуют	-	-	-

2. Сведения о значениях целей и показателей

N	Статус	Наименование целей и	Единица	Факти-	Значения по кварталам	Плановое	Процент	Комментарий

п/п		показателей	измерения (по ОКЕИ)	ческое значение за предыдущий год	I	II	III	IV	значение на конец года	достижения	
1.	Цель - Создание комфортных и безопасных условий жизненной среды, отвечающей функциональным, эстетическим и физиологическим потребностям жителям Котовского муниципального района										
2.	достигнут	Капитальный ремонт электроснабжения одного учреждения культуры	Абсолютный, ед.	0	0	0	0	1	1	100%	

3. Статус исполнения бюджета

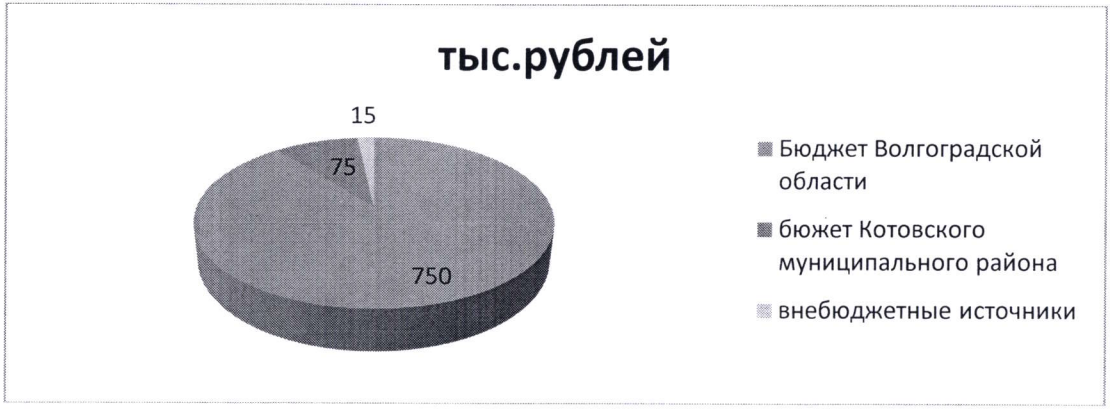

Сведения об исполнении бюджета

N п/п	Статус	Наименование результата приоритетного проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8) / (5) * 100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	достигнут	Капитальный ремонт электроснабжения кинотеатра «Космос», в том числе:							
1.1		федеральный бюджет							
1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.3		консолидированный бюджет Волгоградской области, в т.ч.	825,0	825,0	825,0	825,0	825,0	100	
1.3.1		бюджет Котовского муниципального района	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	100	
1.3.2		бюджет Волгоградской области	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	100	
1.4		внебюджетные источники	15,0	X	X	X	15,0	100	
Всего по приоритетному проекту за счет всех источников, в том числе:			840,0	840,0	840,0	840,0	840,0	100	
федеральный бюджет									
бюджеты государственных внебюджетных фондов									

Российской Федерации							
консолидированный бюджет Волгоградской области	825,0	825,0	825,0	825,0	825,0	100	
внебюджетные источники	15,0	X	X	X	15,0	100	

4. Статус достижения результатов

N п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1.	достигнут	Капитальный ремонт электроснабжения кинотеатра «Космос»	достигнуты

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

N п/п	Уровень контроля [4]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	РМП	достигнут	Капитальный ремонт электроснабжения кинотеатра «Космос»	01.12.2020	01.12.2020/ 01.12.2020	Кудрявцева Н.А. Смолянский Д.А. Политов И.В..	
1.1.	РМП	достигнут	Капитальный ремонт электроснабжения одного учреждения культуры	01.12.2020	01.12.2020/ 01.12.2020	Кудрявцева Н.А. Смолянский Д.А.	

						Политов И.В.	
1.1.1.	РМП	достигнут	Замена электропроводки в зрительном зале и других помещениях кинотеатра, в соответствии с нормами электробезопасности	01.12.2020	01.12.2020/ 01.12.2020	Кудрявцева Н.А. Смолянский Д.А. Политов И.В..	
