Руководитель муниципального проекта
Любименко Светлана Евгеньевна
_____
(подпись, дата)

ОДОБРЕН
Муниципальным проектным офисом
(протокол от "__" ____ 20__ г. N __)

СОГЛАСОВАН
Куратор муниципального проекта
Голосов Василий Васильевич
_____
(подпись, дата)

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«Капитальный ремонт систем отопления и вентиляции кинотеатра «Космос»
Котовского муниципального района»
Общий статус реализации – закрытие

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
отсутствие отклонений	*отсутствие отклонений*	*отсутствие отклонений*	*отсутствие отклонений*	*отсутствие отклонений*


1. Ключевые риски

N п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствуют	-	-	-

2. Сведения о значениях целей и показателей

N п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1.	Цель - Создание комфортных и благоприятных условий жизненной среды, отвечающей функциональным, эстетическим и физиологическим потребностям жителям Котовского муниципального района										
1.1	достигнут	Капитальный ремонт системы отопления одного учреждения культуры	Абсолютный, ед.	0	0	0	0	1	1	100%	
1.2	достигнут	Капитальный ремонт системы вентиляции одного учреждения культуры	Абсолютный, ед.	0	0	0	0	1	1	100%	

3. Статус исполнения бюджета

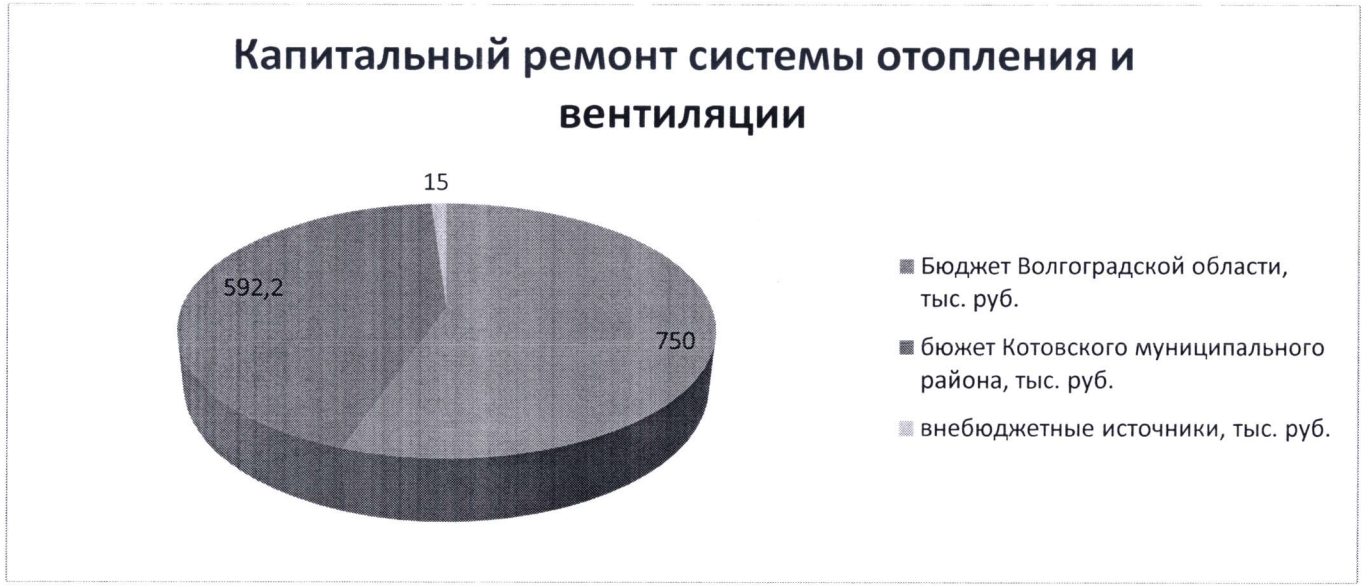

Сведения об исполнении бюджета

N п/п	Статус	Наименование результата приоритетного проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8) / (5) * 100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	достигнут	Капитальный ремонт систем отопления и вентиляции кинотеатра «Космос» Котовского муниципального района							

		, в том числе:							
1.1		федеральный бюджет							
1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.3		консолидированный бюджет Волгоградской области, в т.ч.	1342,2	1342,2	1342,2	1342,2	1342,2	100	
1.3.1		бюджет Котовского муниципального района	592,0	592,0	592,0	592,0	592,0	100	
1.3.2		бюджет Волгоградской области	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	100	
1.4		внебюджетные источники	15,0	X	X	X	15,0	100	
Всего по приоритетному проекту за счет всех источников, в том числе:			1357,2	1357,2	1357,2	1357,2	1357,2	100	
федеральный бюджет									
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
консолидированный бюджет Волгоградской области			1342,2	1342,2	1342,2	1342,2	1342,2	100	
внебюджетные источники			15,0	X	X	X	15,0	100	

4. Статус достижения результатов

N п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1.	достигнут	Капитальный ремонт системы отопления кинотеатра «Космос»	достигнуты

2.	достигнут	Капитальный ремонт системы вентиляции кинотеатра «Космос»	достигнуты

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

N п/п	Уровень контроля [4]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	РМП	достигнут	Капитальный ремонт системы отопления кинотеатра «Космос»	01.12.2020	01.12.2020/ 01.12.2020	Кудрявцева Н.А. Смолянский Д.А. Овчелупов А.М.	
1.1.	РМП	достигнут	Капитальный ремонт системы отопления одного учреждения культуры	01.12.2020	01.12.2020/ 01.12.2020	Кудрявцева Н.А. Смолянский Д.А. Овчелупов А.М.	
1.1.1.	РМП	достигнут	Замена металлических регистров на алюминиевые радиаторы, металлического трубопровода отопления на трубопровод из полипропилена	01.12.2020	01.12.2020/ 01.12.2020	Кудрявцева Н.А. Смолянский Д.А. Овчелупов А.М.	

2.	РМП	достигнут	Капитальный ремонт системы вентиляции кинотеатра «Космос»	01.12.2020	01.12.2020/ 01.12.2020	Кудрявцева Н.А. Смолянский Д.А. Овчелупов А.М.	
2.1.	РМП	достигнут	Капитальный ремонт системы вентиляции одного учреждения культуры	01.12.2020	01.12.2020/ 01.12.2020	Кудрявцева Н.А. Смолянский Д.А. Овчелупов А.М.	
2.1.1.	РМП	достигнут	Замена приточной вентиляционной системы и оборудования в зрительном зале и других помещениях кинотеатра	01.12.2020	01.12.2020/ 01.12.2020	Кудрявцева Н.А. Смолянский Д.А. Овчелупов А.М.	
